云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	红河聚泰矿业有限公司	08.2.钢丝绳（无损）	Q/YNGH-RE8.2-26097	李若胜	赵艳川	2026/7/22	2026/7/31	合格
2	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26098	李若胜	赵艳川	2026/7/23	2026/7/31	合格
3	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26099	李若胜	赵艳川	2026/7/22	2026/7/31	合格
4	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26100	李若胜	赵艳川	2026/7/23	2026/7/31	合格
5	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26101	李若胜	赵艳川	2026/7/23	2026/7/31	合格
6	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26102	李若胜	赵艳川	2026/7/23	2026/7/31	合格
7	红河聚泰矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26103	李若胜	赵艳川	2026/7/22	2026/7/31	合格
8	红河聚泰矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26050	王宇	叶家宝	2026/7/28	2026/8/14	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26097

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（88 号井提升机）
型 号 规 格：	31.0 6×19S+NFC 1770
检测检验地点：	88 号井提升机房、88 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

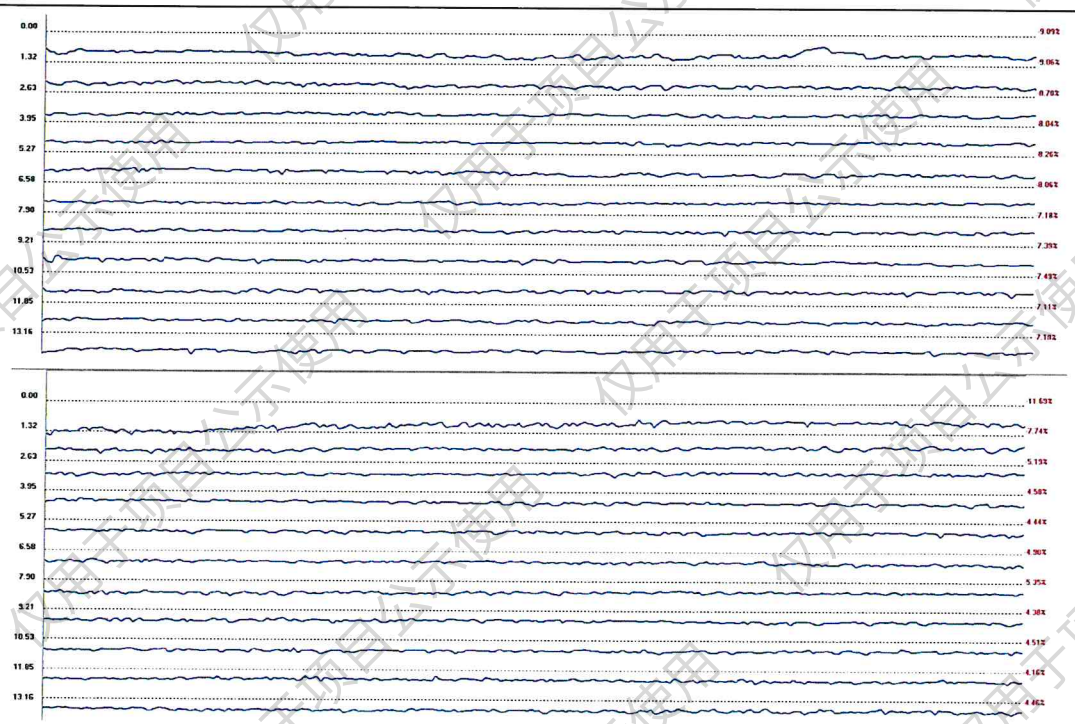
报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26097　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	88 号井提升机
型号规格		31.0 6×19S+NFC 1770	出厂日期	2022 年 9 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		88 号井提升机房、88 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 22 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 11.69%，被测长度的钢丝绳可在加强监测条件下使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 21 日		

批准：　日期：2026.7.30　　审核：　日期：2026.7.30　　主检：　日期：2026.7.30

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26098

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（3 号井提升机）
型 号 规 格：	31.0 6×19S+NFC 1770
检测检验地点：	3 号井提升机房、3 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 23 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26098　　共 6 页　第 1 页

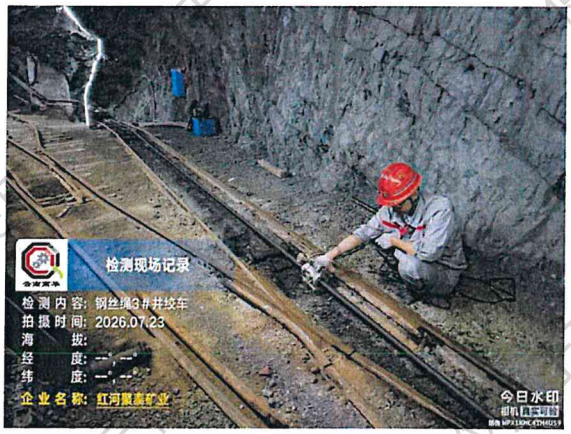
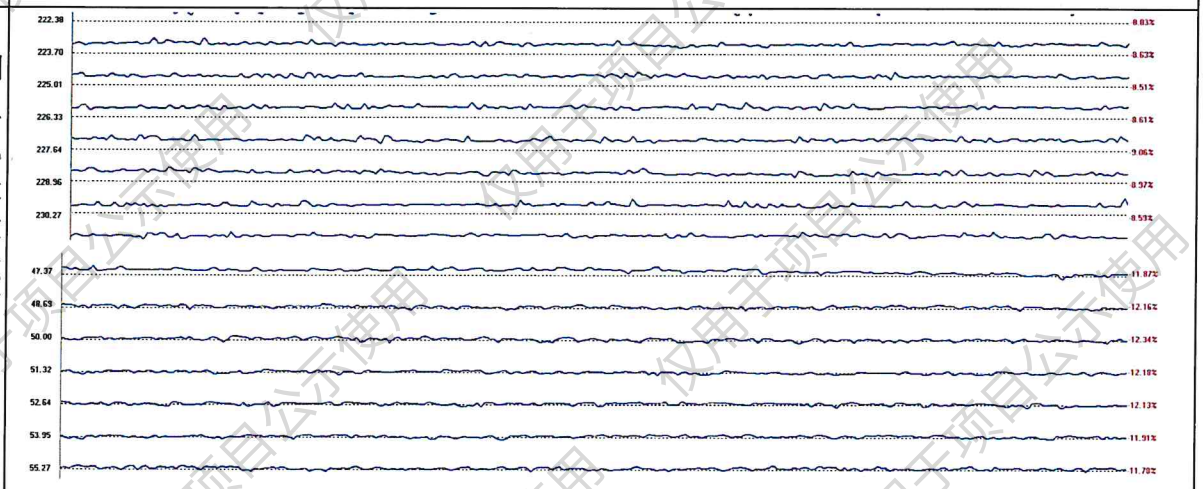
委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	3 号井提升机
型号规格		31.0 6×19S+NFC 1770	出厂日期	/
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3 号井提升机房、3 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 23 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 12.34%，被测长度的钢丝绳可在加强监测条件下使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 22 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26099

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（88 号井猴车）
型 号 规 格：	20.0 6×36WS+FC 1670
检测检验地点：	88 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26099　　共 6 页　第 1 页

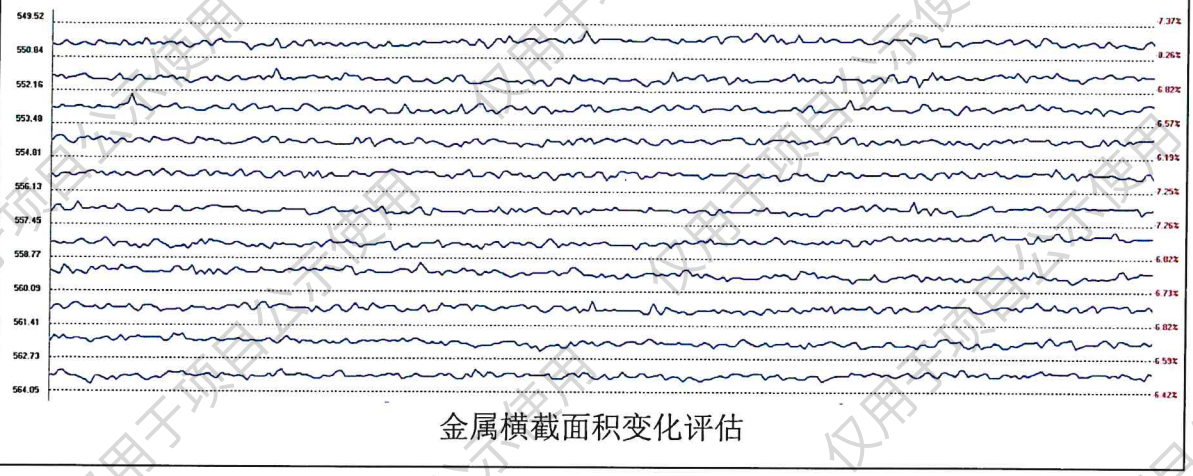
委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	88 号井猴车
型号规格		20.0 6×36WS+FC 1670	出厂日期	2024 年 8 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		88 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 22 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.26%，被测长度的钢丝绳可在加强养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用☑　监测使用□　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 21 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26100

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（1 号井猴车）
型 号 规 格：	20.0 6×36WS+FC 1670
检测检验地点：	1 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 23 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司


金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26100　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	1 号井猴车
型号规格		20.0 6×36WS+FC 1670	出厂日期	2024 年 8 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 23 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 9.87%，被测长度的钢丝绳可在加强养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 22 日		

批准：　日期：2026.7.30　　审核：　日期：2026.7.30　　主检：　日期：2026.7.30

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26101

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（1 号井提升绞车）
型 号 规 格：	24.5 6×19S+NFC 1770
检测检验地点：	1 号井提升绞车房、1 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 23 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

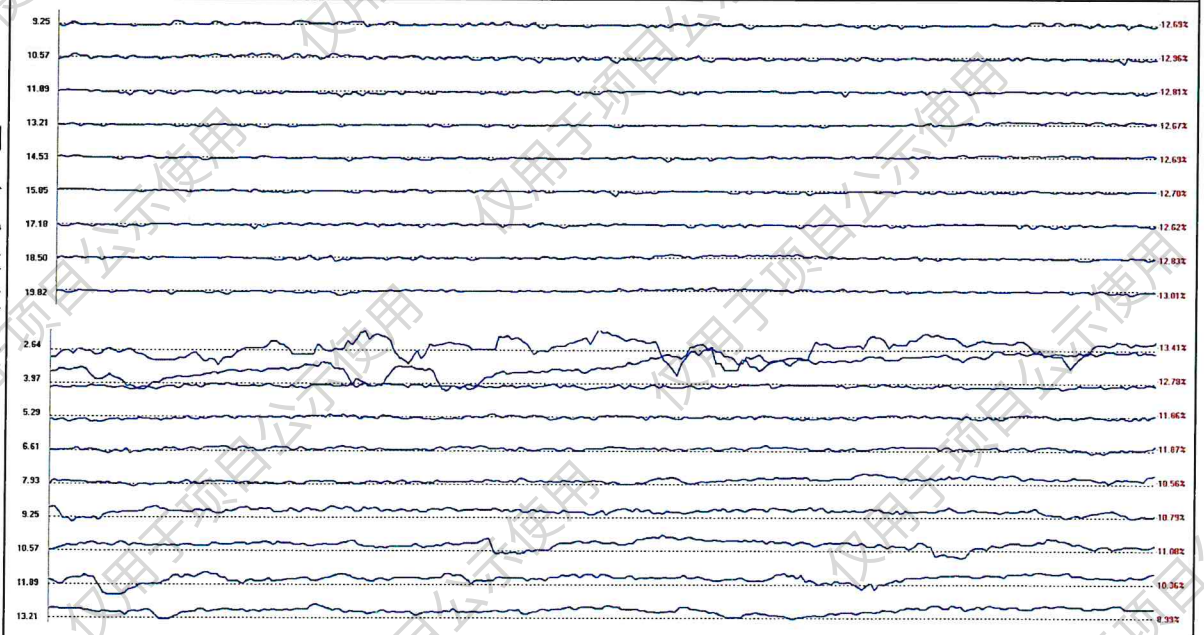
报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26101　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	1 号井提升绞车
型号规格		24.5 6×19S+NFC 1770	出厂日期	2023 年 8 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号井提升绞车房、1 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 23 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 13.41%，被测长度的钢丝绳可在加强监测条件下使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 22 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30　　日期：2026-7-30

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26102

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（2 号井提升绞车）
型 号 规 格：	24.5 6×19S+NFC 1770
检测检验地点：	2 号井提升绞车房、2 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 23 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

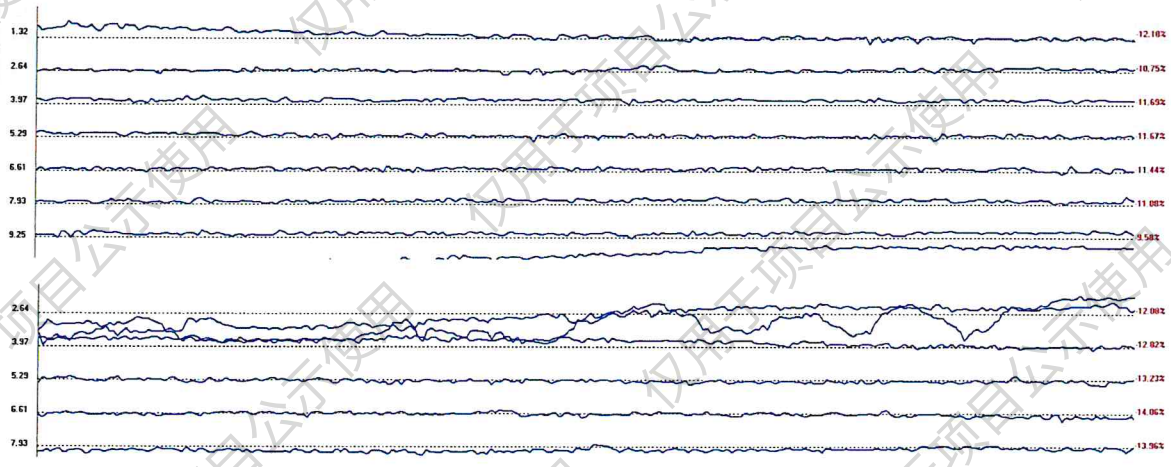
金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26102　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	2 号井提升绞车
型号规格		24.5 6×19S+NFC 1770	出厂日期	2024 年 4 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2 号井提升绞车房、2 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 23 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 14.06%，被测长度的钢丝绳可在加强监测条件下使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 22 日		

批准：　日期：2026.7.30　　审核：　日期：2026.7.30　　主检：　日期：2026.7.30

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华

应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26103

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	中特检测技术服务（云南）有限公司
受 检 单 位：	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿
设 备 名 称：	钢丝绳（99 号井提升绞车）
型 号 规 格：	24.5 6×19S+NFC 1770
检测检验地点：	99 号井提升绞车房、99 号井井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 7 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

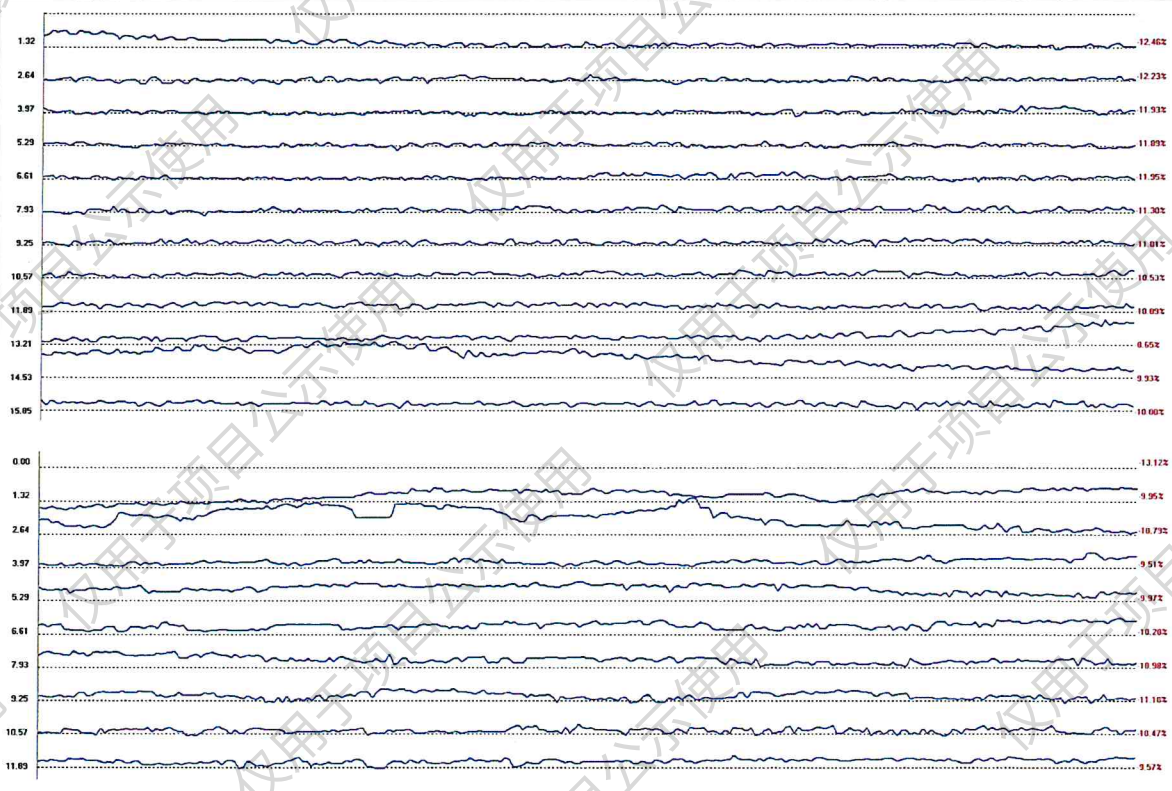
报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26103　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务（云南）有限公司		
	地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
设备名称		钢丝绳	设备编号	99 号井提升绞车
型号规格		24.5 6×19S+NFC 1770	出厂日期	2024 年 6 月
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		99 号井提升绞车房、99 号井井口	检测检验日期	2026 年 7 月 22 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 13.12%，被测长度的钢丝绳可在加强监测的条件下使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 7 月 30 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 21 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.30　　日期：2026.7.30　　日期：2026-7-30

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26050

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：中特检测技术服务(云南)有限公司

受 检 单 位：红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿

设 备 名 称：绝缘工器具

型 号 规 格：见内文

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 28 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26050　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	中特检测技术服务(云南)有限公司		
	地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处		
工器具名称		绝缘工器具	设备编号	详见被检对象基本信息表
型号规格		详见被检对象基本信息表	出厂日期	/
生产单位		天津市恒聚源泰橡胶制品有限公司等		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 7 月 28 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	红河聚泰矿业有限公司建水县普雄乡挣财洞铅锌矿		
	地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县普雄乡落水洞村		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 12 kV 绝缘手套 6 只，合格； 25 kV 绝缘靴 4 只，合格； 10 kV 验电器 4 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 8 月 11 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		有效期：绝缘手套及绝缘靴（鞋）6 个月，其他 1 年		

批准：　　审核：　　主检：王宇

日期：2026.8.11　　日期：2026.8.11　　日期：2026.8.11

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用
