云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	金平县富强矿业有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26067	杨锦松	吴邦达	2026/7/29	2026/8/25	合格
2	金平县富强矿业有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26041	杨锦松	吴邦达	2026/7/29	2026/9/2	合格
3	金平县富强矿业有限公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26420	杨锦松	吴邦达	2026/7/29	2026/8/25	合格
4	金平县富强矿业有限公司		Q/YNGH-RE23-26421	杨锦松	吴邦达	2026/7/29	2026/8/25	合格
5	金平县富强矿业有限公司		Q/YNGH-RE23-26422	杨锦松	吴邦达	2026/7/29	2026/8/25	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26067

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平县富强矿业有限公司

受 检 单 位：金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿

设 备 名 称：轴流通风机

型 号 规 格：K40-4

检测检验地点：211 中段主扇风机

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26067　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	金平县富强矿业有限公司		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
设备名称		轴流通风机	设备编号	STK751
型号规格		K40-4	出厂日期	/
制造单位		昆明市登驰通风设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		211 中段主扇风机	检测检验日期	2026 年 7 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 24 日				
检测检验组成员	吴邦达、杨锦松				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 28 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26041

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：金平县富强矿业有限公司

受 检 单 位：金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿

项 目 名 称：茅草坪铁矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：茅草坪铁矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

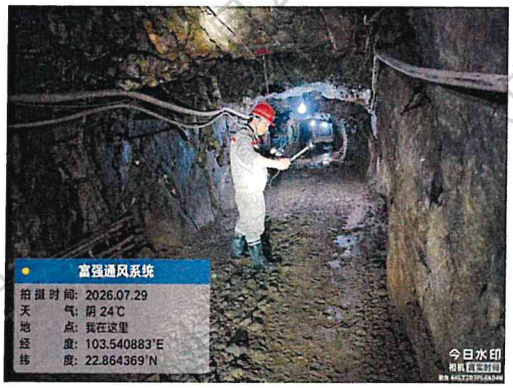
报告编号：Q/YNGH-RE11-26041　　共 32 页　第 1 页

委托单位	名称	金平县富强矿业有限公司		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
项目名称		茅草坪铁矿通风系统检测鉴定		
生产规模		5 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		茅草坪铁矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 7 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 28 日		
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 28 日		

批准：胡春林　　审核：乔松伟　　主检：杨锦松

日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	茅草坪铁矿通风系统检测点位布置图见附件

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26420

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 金平县富强矿业有限公司

受 检 单 位 ： 金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿

设 备 名 称 ： 矿用自卸车（5#）

型 号 规 格 ： UQ-8

检测检验地点： 维修车间

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 7 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26420　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平县富强矿业有限公司		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
设备名称		矿用自卸车	设备编号	5#
型号规格		UQ-8	出厂日期	2023 年 8 月
制造单位		山东蒂辉机械设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		维修车间	检测检验日期	2026 年 7 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	4
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 29 日			
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 28 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.29　　日期：2026.8.24　　日期：2026.8.29

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26421

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平县富强矿业有限公司

受 检 单 位：金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿

设 备 名 称：矿用自卸车（6#）

型 号 规 格：UQ-2

检测检验地点：维修车间

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26421　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平县富强矿业有限公司		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
设备名称		矿用自卸车	设备编号	6#
型号规格		UQ-2	出厂日期	2024 年 7 月
制造单位		玉溪新天力农业装备制造有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		维修车间	检测检验日期	2026 年 7 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜2；C 类不合格项＜6 检测结果：0；1；2 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 24 日		
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 28 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26422

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平县富强矿业有限公司

受 检 单 位：金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿

设 备 名 称：矿用自卸车（7#）

型 号 规 格：UQ-8

检测检验地点：维修车间

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26422　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平县富强矿业有限公司		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
设备名称		矿用自卸车	设备编号	7#
型号规格		UQ-8	出厂日期	2023 年 8 月
制造单位		山东蒂辉机械设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		维修车间	检测检验日期	2026 年 7 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平县富强矿业有限公司金平县茅草坪铁矿		
	地址	云南省红河州金平县勐桥乡茅草坪村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜2；C 类不合格项＜6 检测结果：A 类不合格项 0；B 类不合格项 1；C 类不合格项 4 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 24 日		
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 28 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24　　日期：2026.8.24

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用
