云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南吉宝商贸有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26069	乔松伟	杨雄鑫	2026/8/14	2026/8/21	合格
2	云南吉宝商贸有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26042	乔松伟	杨雄鑫	2026/8/14	2026/8/21	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26069

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿

受 检 单 位：云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿

设 备 名 称：矿井轴流通风机（2025Z006DS）

型 号 规 格：K40-4-№15/90

检测检验地点：2075m 硐口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26069　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿		
	地址	云南省玉溪市元江县洼垤乡		
设备名称		矿井轴流通风机	设备编号	2025Z006DS
型号规格		K40-4-№15/90	出厂日期	2025 年 4 月
制造单位		山西晋运安风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2075m 硐口	检测检验日期	2026 年 8 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿		
	地址	云南省玉溪市元江县洼垤乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	1	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日				
检测检验组成员	乔松伟、杨雄鑫				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 13 日				

批准：　日期：2026.8.20　　审核：　日期：2026.8.20　　主检：乔松伟　日期：2026.8.20

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26042

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位 ： 云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿

受 检 单 位 ： 云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿

项 目 名 称 ： 元江县它尼吉铁矿通风系统检测鉴定

检测检验地点： 元江县它尼吉铁矿矿井系统

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 8 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26042　　共 33 页　第 1 页

委托单位	名称	云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿		
	地址	云南省玉溪市元江县洼垤乡		
项目名称		元江县它尼吉铁矿通风系统检测鉴定		
生产规模		20 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于基建结束待验收状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		元江县它尼吉铁矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 8 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南吉宝商贸有限公司元江县它尼吉铁矿		
	地址	云南省玉溪市元江县洼垤乡		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日		
检测检验组成员		乔松伟、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 13 日		

批准：　　审核：　　主检：乔松伟

日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20

仅用于项目公示使用


4 必要的图表、图片

<table>
<tr><td>设备照片</td><td>


</td></tr>
<tr><td>现场检测照片</td><td>



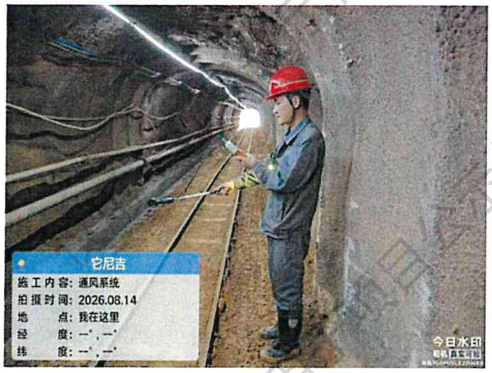


</td></tr>
<tr><td>相关图表</td><td>通风系统检测点位布置图见附件</td></tr>
</table>
